

**Către,  
Primăria Comunei Agigea**



Referitor: „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Agigea – Rețea de distribuție și branșamente medie presiune pentru alimentarea cu gaze naturale a localității Agigea”

Prin prezenta, vă transmitem lista străzilor cuprinse în prima etapă a execuției rețelei de distribuție gaze naturale inclusă în planul de investiții al anului 2015.

Vă rugăm să ne informați în legătură cu data la care se poate face predarea de amplasament, în vederea începerii execuției lucrărilor.

Anexăm schema de calcul aferentă localității, cu marcarea străzilor aferente etapei întâi.

Director General  
Călin Chirteș



Director Dezvoltare Operare  
Neculai Stamate


## Etapa I Agigea

Nr. crt.	Denumire stradă	Tronson	Dn	Lungime
	<b>Steaua de Mare</b>			
1	Emil Racoviță	1-2	90	120,00
		2-3	63	120,00
		3-5	63	205,00
		5-6	63	145,00
		6-8	40	127,00
2	Grigore Antipa	2-4	63	154,00
		4-5	40	226,00
3	Victor Babeș	3-4	40	62,00
4	Alee	6-7	40	130,00
	<b>Distribuție Agigea</b>			
1	N. Titulescu	1-6	250	281,00
		6-16	225	1.691,00
		16-18	200	420,00
		18-20	180	59,00
		20-21	180	91,00
		21-22	160	104,00
2	Virgil Teodorescu	21-46	125	115,00
		46-45	125	53,00
		45-44	110	50,00
3	Șos. Mangaliei	22-153	40	104,00
		22-111	40	233,00
4	N. Bălcescu	111-44	90	86,00
		44-43	110	177,00
		43-106	75	77,00
5	Ion Creangă	106-107	63	102,00
		107-108	63	247,00
		108-109	40	64,00
6	Radu Tudoran	46-128	40	113,00
7	Liviu Rebreanu	45-127	40	167,00
8	A. Vlahuță	108-110	63	7,00
		110-114	2"	8,00
		114-123	40	175,00
9	Avram Iancu	111-112	75	75,00
		112-40	75	61,00
		40-39	63	138,00
		39-38	63	54,00
		38-37	63	27,00
		37-98	63	30,00
		98-99	40	60,00
10	Bogdan Vodă	112-42	40	253,00
11	Alee	42-105	40	70,00
12	Vlad Țepeș	40-41	40	267,00
13	D. Cantemir	39-104	40	309,00
14	C. Brâncoveanu	38-103	40	294,00
15	Ion Corvin	98-101	40	281,00
16	Petru Rareș	99-100	40	227,00

17	Zmeurei	100-101	40	101,00
		101-102	40	81,00
18	Petru Mușat	104-42	63	135,00
		102-103	40	47,00
		103-104	40	68,00
19	Ecluzei	102-105	40	235,00
20	A.I.Cuza	148-143	40	318,00
		145-5	40	232,00
21	G. Ghica	143-142	40	106,00
		142-8	40	100,00
22	Gh. Anghelescu	142-9	40	160,00
23	D. Strurza	150-10	40	72,00
24	Al. Odobescu	143-7	40	148,00
25	W. Mărăcineanu	144-6	40	195,00
26	M. Viteazu	146-4	40	250,00
27	Henri Coandă	147-3	40	250,00
28	I. Borcea	149-2	40	130,00
Total				<b>10.487,00</b>

# LEGENDA

- Conducta distributie gaze naturale presiune medie - proiectata
  - ⊗ Robinet (PE) - proiectat
- |      |  |
|------|--|
| 12   | numar bara   |
| 63   | diametru exterior bara [mm]                          |
| 128  | lungime bara [m]                                     |
| 1250 | debit total transportat pe bara [Nm <sup>3</sup> /h] |

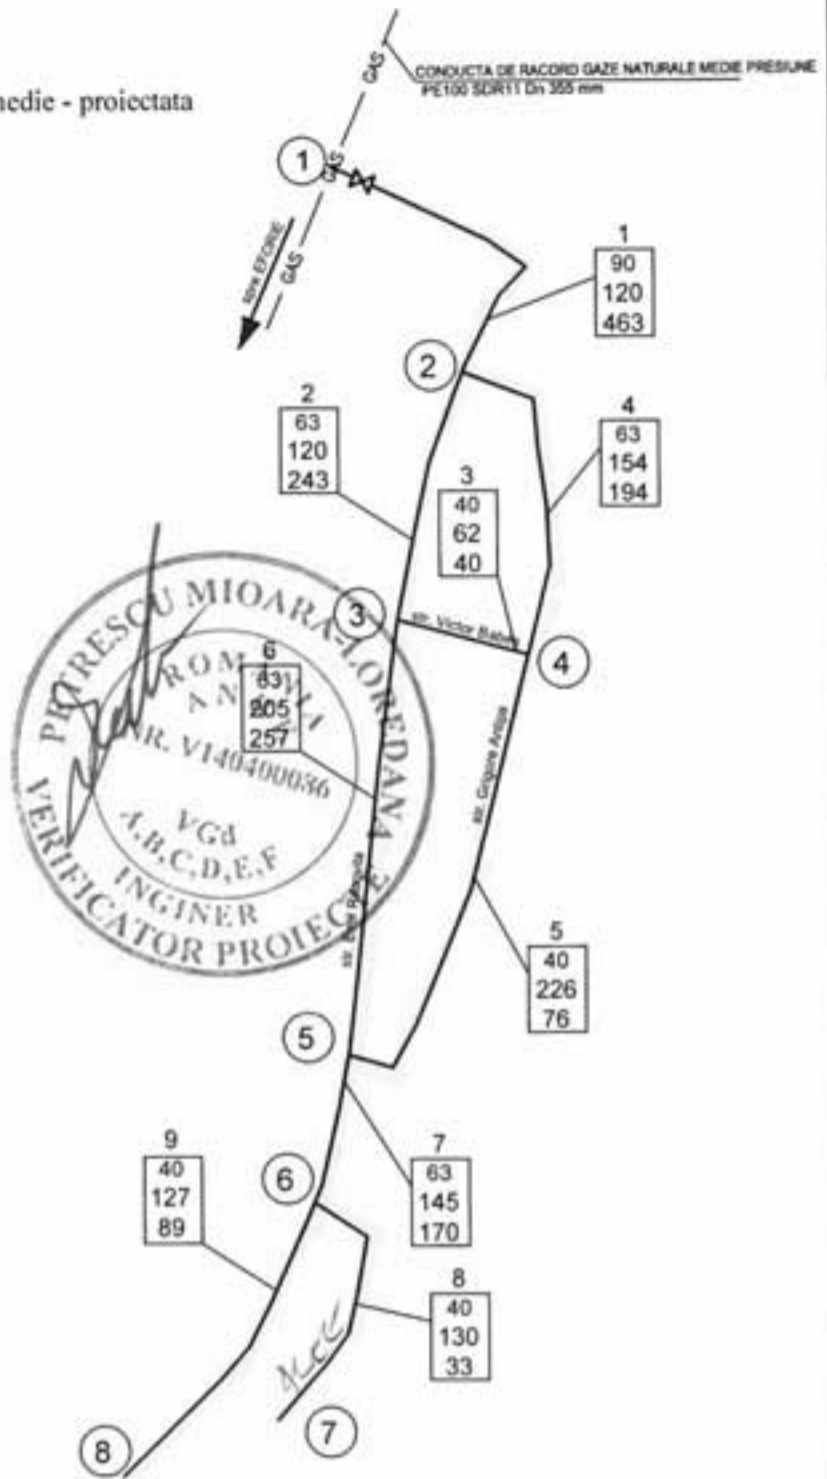

## INSTALATOR AUTORIZAT

PROIECTANT,  
 Ing. CIORTAN MIHAELA  
 Instalator autorizat gr. I D  
 Aut. nr. 311130392  
 eliberata de A.N.R.E. Bucuresti



Proiectat	Ing. Ciortan Mihaela	<i>MCC</i>	PT D0305-2014	INFINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA AGIGEA RETEA DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE MEDIE PRESIUNE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A LOCALITATII AGIGEA, JUD. CONSTANTA	plan nr. A.02 plansa 2/2
Desenat	Ing. Buiuca Carmen	<i>Marsuca</i>		Inlocuieste desen nr.	
Verificat	Ing. Buiuca Carmen	<i>Marsuca</i>		Nr. inventar	
Contr. STAS	Ing. Ciortan Mihaela	<i>MCC</i>		Masa neta:	
Aprobat	Ing. Ciortan Mihaela	<i>MCC</i>			
S.C. RELCO-GAZ S.R.L. CONSTANTA			scara: (%)	SCHEMA DE CALCUL	
			Data: mai 2014		
